Esper 用記入用紙

図は外観表示

サッシ色：B・W・S・T・その他（　　）

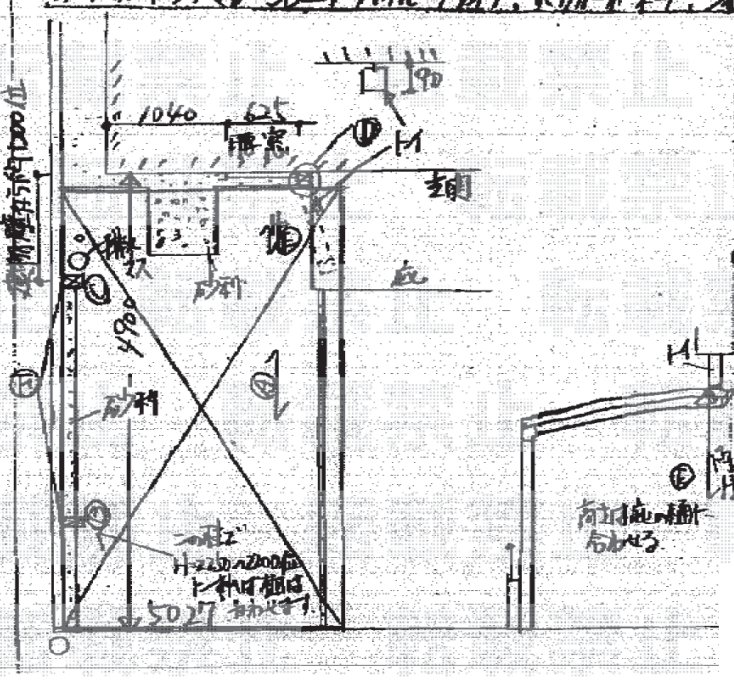



カーブポートシグマV 5027 ハイルーフタイプ、ダブルオープン、シャンプレー 集荷土間 確認作業

㋐ 集荷土間

㋑ 柱移動 道路側に150㎜移動。

㋒ 基礎マス並に土台を書ける。

㋓ 駐車は、柵から100～200㎜あけて駐車。

㋔ 高土は、柵から100～200㎜あけて高さを設定して下さい。道路側の柱で内法2250～2300㎜位にはると良いです。

㋕ 砂利は7㎝、残土、ガラ等含有ります。土間仕上は、現況と同じ様にして下さい。

※施工日を出来るだけ早くしてほしいとの事。
決定日が決まったら必ず施主様に連絡して下さい。
